



常 温 式
試験車両 ラインマーカー
札幌830 す 24-68
正 面
令和6年4月4日



常 温 式
試験車両 ラインマーカー
札幌830 す 24-68
側 面
令和6年4月4日



常 温 式
試験車両 ラインマーカー
札幌830 す 24-68
背 面
令和6年4月4日



工事名	令和6年度 社内試験施工	
工 種	区画線工	略 図 札幌 800 寸 24-68
撮影月日	令和 6年 4月 4日	常温式
位 置	札幌市東区東雁来	エンジン 回転数
設計寸法		1400rpm
実測寸法		
立会監督員	工事課長 中城 勝	(株)札幌ロードメイク

常 温 式

試験車両
ラインマーカー

札幌830
す 24-68

エンジン回転数

1400rpm

令和6年4月4日



工事名	令和6年度 社内試験施工	
工 種	区画線工	略 図 札幌 800 寸 24-68
撮影月日	令和 6年 4月 4日	常温式
位 置	札幌市東区東雁来	空気元圧
設計寸法		7 kgf/cm²
実測寸法		
立会監督員	工事課長 中城 勝	(株)札幌ロードメイク

常 温 式

試験車両
ラインマーカー

札幌830
す 24-68

空気元圧

7kgf/cm²

令和6年4月4日



工事名	令和6年度 社内試験施工	
工 種	区画線工	略 図 札幌 800 寸 24-68
撮影月日	令和 6年 4月 4日	常温式
位 置	札幌市東区東雁来	ビーズタンク圧
設計寸法		0.18MPa
実測寸法		
立会監督員	工事課長 中城 勝	(株)札幌ロードメイク

常 温 式

試験車両
ラインマーカー

札幌830
す 24-68

ビーズタンク圧

0.18Mpa

令和6年4月4日



常 温 式
試験車両 ラインマーカー
札幌830 す 24-68
1次ポンプ圧力
25kgf/cm ²
令和6年4月4日



常 温 式
試験車両 ラインマーカー
札幌830 す 24-68
2次ポンプ圧力
50kgf/cm ²
令和6年4月4日



常 温 式
試験車両 ラインマーカー
札幌830 す 24-68
2次ポンプ吐出圧力
7.0Mpa
令和6年4月4日



常 温 式
ペイント
吐出前空缶 計量状況
3回目
1148.0g
令和6年4月4日



常 温 式
ペイント
吐出前空缶 計量状況
3回目
1148.0g
令和6年4月4日




常 温 式
ペイント
吐出前空缶 計量状況
立会人工事課長 中城 勝
令和6年4月4日




常 温 式
ガラスビーズ
吐出前空缶 計量状況
1回目
1144.0g
令和6年4月4日



常 温 式
ガラスビーズ
吐出前空缶 計量状況
1回目
1144.0g
令和6年4月4日

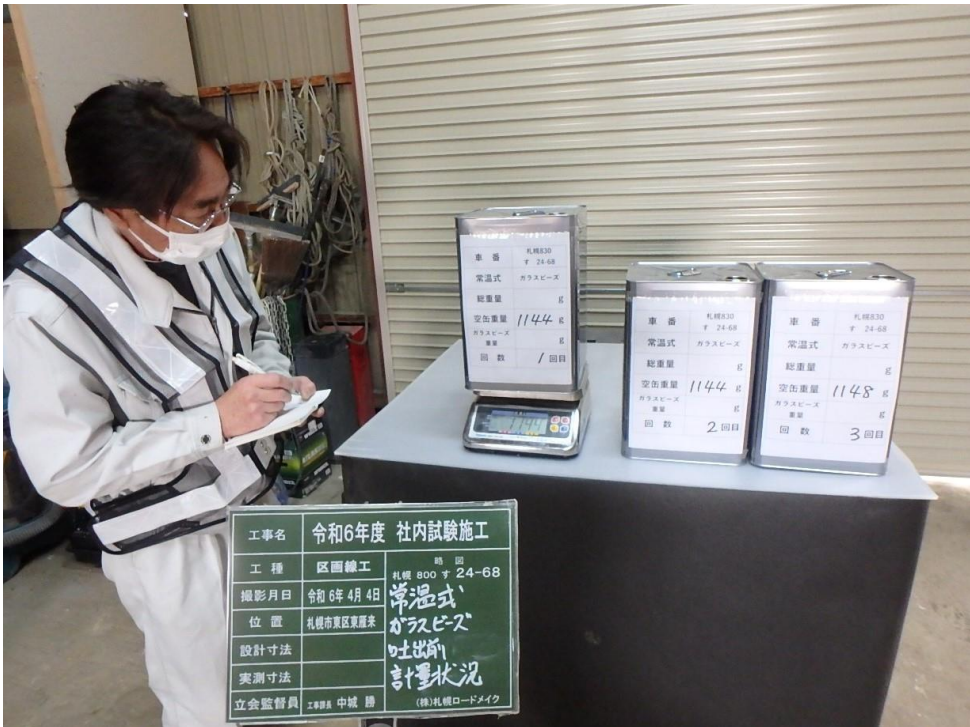

常 温 式
ガラスビーズ
吐出前空缶 計量状況
立会人工事課長 中城 勝
令和6年4月4日

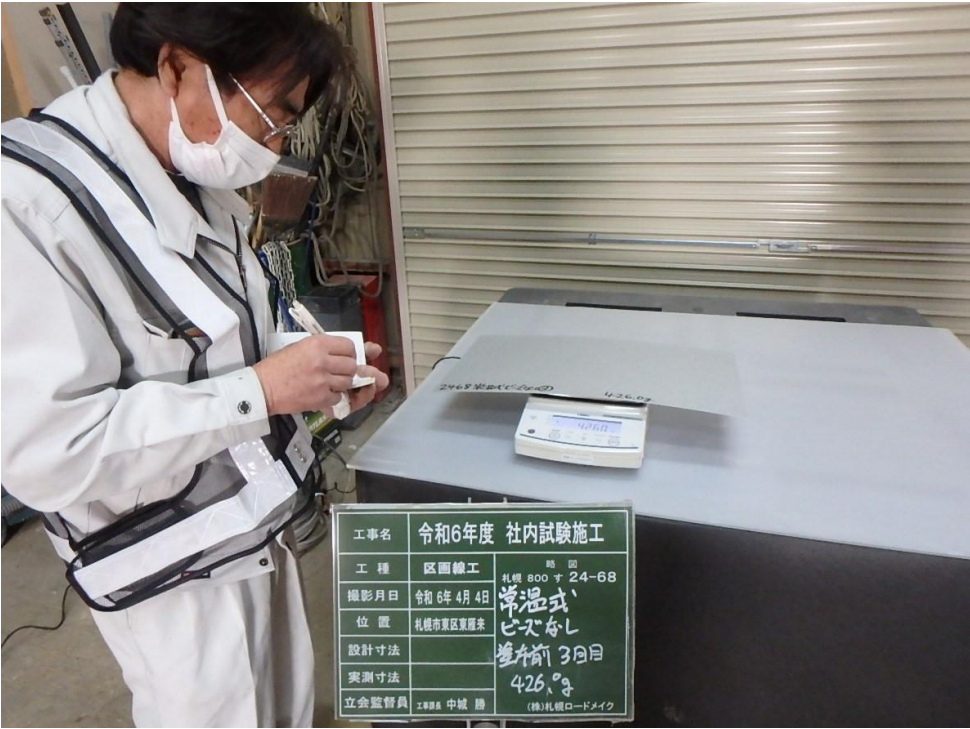


常 温 式
ビーズなし
吐出前テスト板 計量状況
3枚目
426.0g
令和6年4月4日




常 温 式
ビーズなし
吐出前テスト板 計量状況
3枚目
426.0g
令和6年4月4日



常 温 式
ビーズなし
吐出前テスト板 計量状況
立会人工事課長 中城 勝
令和6年4月4日

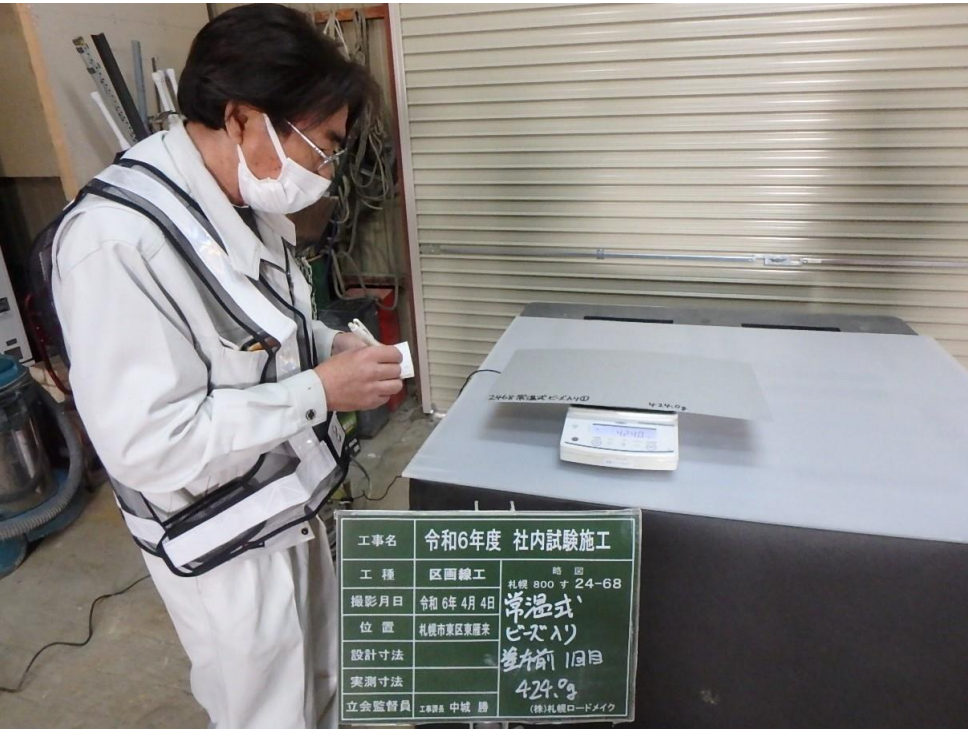

常 温 式
ビーズ入り
吐出前テスト板 計量状況
1枚目
424.0g
令和6年4月4日

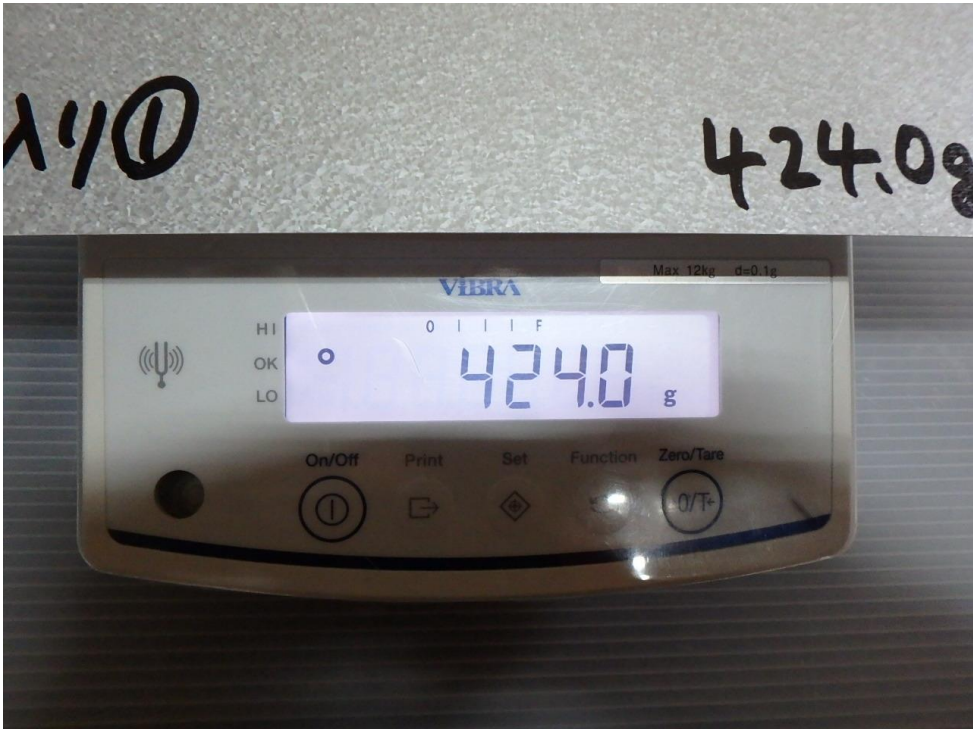

常 温 式
ビーズ入り
吐出前テスト板 計量状況
1枚目
424.0g
令和6年4月4日



常 温 式
ビーズ入り
吐出前テスト板 計量状況
立会人工事課長 中城 勝
令和6年4月4日




工事名	令和6年度 社内試験施工	
工 種	区画線工	略 図
撮影月日	令和 6年 4月 4日	札幌 800 寸 24-68
位 置	札幌市東区東照来	常温式
設計寸法		ペイント
実測寸法		吐出状況
立会監督員	工事課長 中城 勝	2回目
(株)札幌ロードメイク		

常 温 式
ペイント
静止状態 吐出状況
2回目
立会人 工事課長 中城 勝
令和6年4月4日



工事名	令和6年度 社内試験施工	
工 種	区画線工	略 図
撮影月日	令和 6年 4月 4日	札幌 800 寸 24-68
位 置	札幌市東区東照来	常温式
設計寸法		ガラスビーズ
実測寸法		吐出状況
立会監督員	工事課長 中城 勝	1回目
(株)札幌ロードメイク		


常 温 式
ガラスビーズ
静止状態 吐出状況
1回目
立会人 工事課長 中城 勝
令和6年4月4日

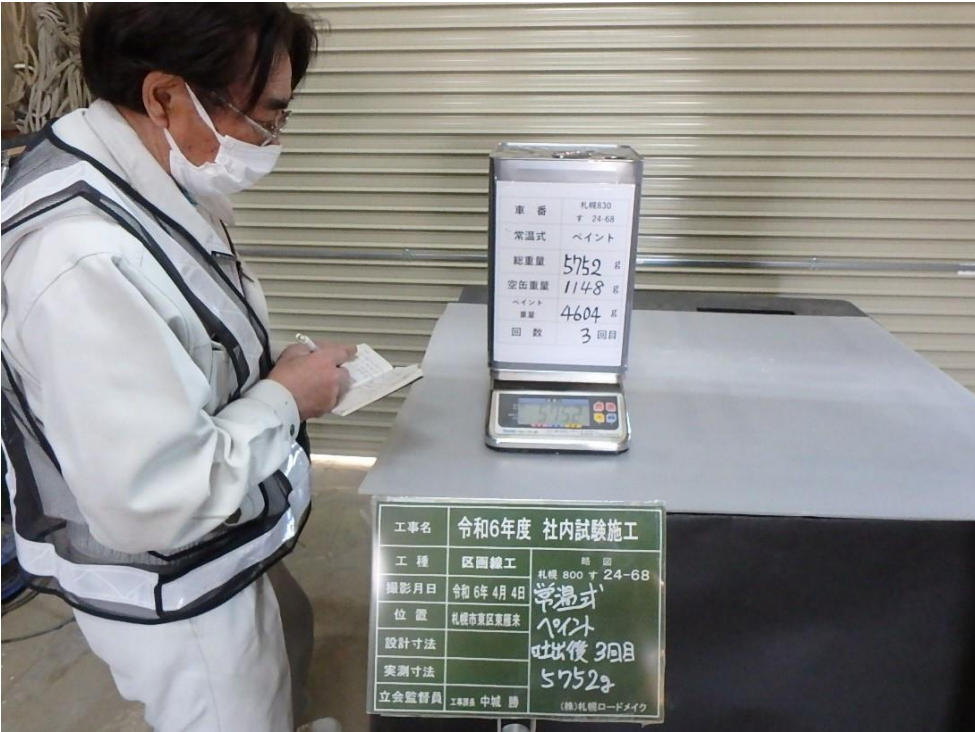

常 温 式
ペイント
吐出後計量状況
3回目
総重量
5752.0g
空缶重量
1148.0g
ペイント重量
4604.0g
令和6年4月4日



常 温 式
ペイント
吐出後計量状況
3回目
総重量
5752.0g
空缶重量
1148.0g
ペイント重量
4604.0g
令和6年4月4日

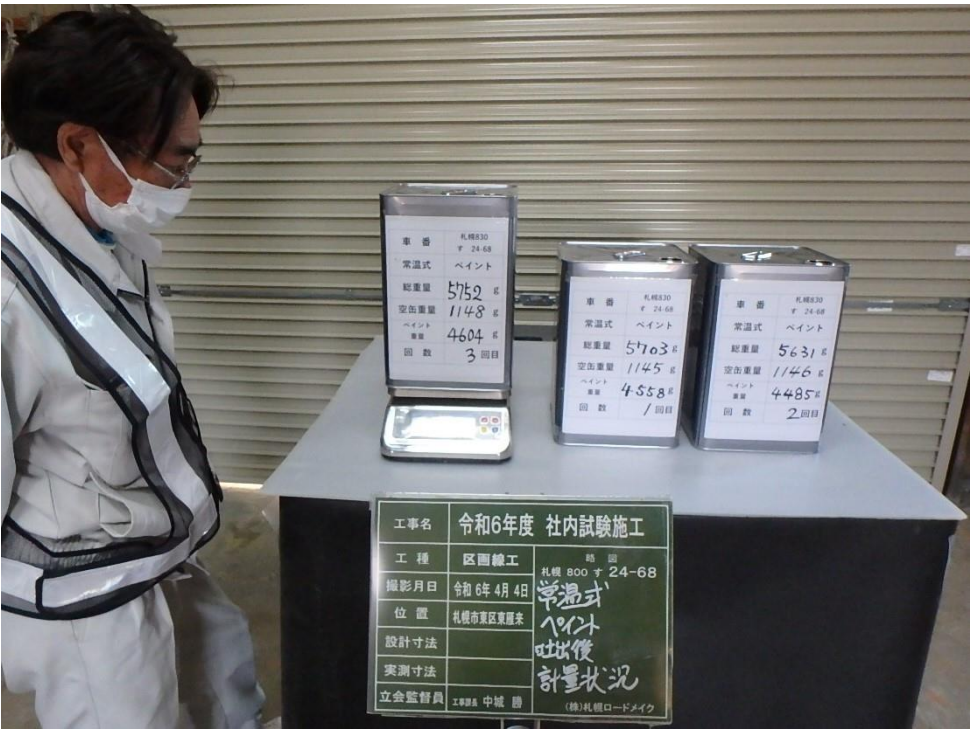

常 温 式
ペイント
吐出後計量状況
立会人 工事課長
中城 勝
令和6年4月4日



常 温 式
ガラスビーズ
吐出後計量状況
2回目
総重量 3340.0g
空缶重量 1144.0g
ペイント重量 2196.0g
令和6年4月4日



常 温 式
ガラスビーズ
吐出後計量状況
2回目
総重量 3340.0g
空缶重量 1144.0g
ペイント重量 2196.0g
令和6年4月4日



常 温 式
ガラスビーズ
吐出後計量状況
立会人 工事課長 中城 勝
令和6年4月4日



常 温 式

走行試験状況

立会人 工事課長

中城 勝

令和6年4月4日



常 温 式

走行試験状況

ビーズなし
試験片採取後

立会人 工事課長

中城 勝

令和6年4月4日



常 温 式

走行試験状況

ビーズ入り
試験片採取後


立会人 工事課長

中城 勝

令和6年4月4日



常 温 式
ビーズなし
吐出後テスト板 計量状況
3枚目
総重量 465.1g
テスト板重量 426.0g
ペイント重量 39.1g
令和6年4月4日

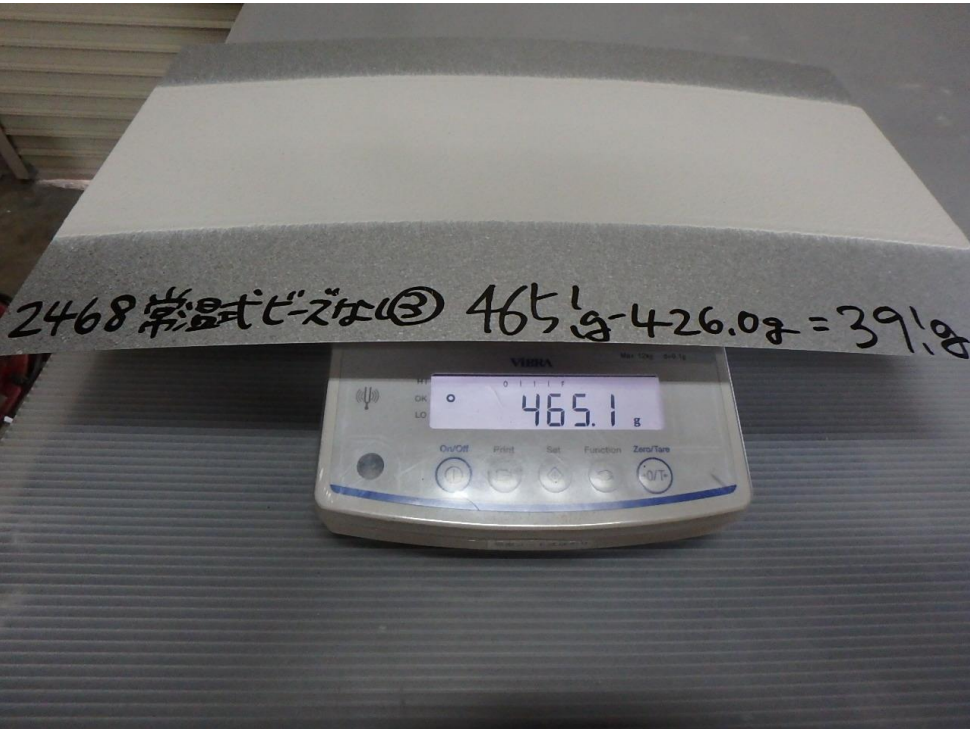


常 温 式
ビーズなし
吐出後テスト板 計量状況
3枚目
総重量 465.1g
テスト板重量 426.0g
ペイント重量 39.1g
令和6年4月4日



常 温 式
ビーズなし
吐出後テスト板 計量状況
立会人 工事課長 中城 勝
令和6年4月4日



常 温 式
ビーズ入り
吐出後テスト板 計量状況
1枚目
総重量 482.0g
テスト板重量 424.0g
ペイント重量 58.0g
令和6年4月4日

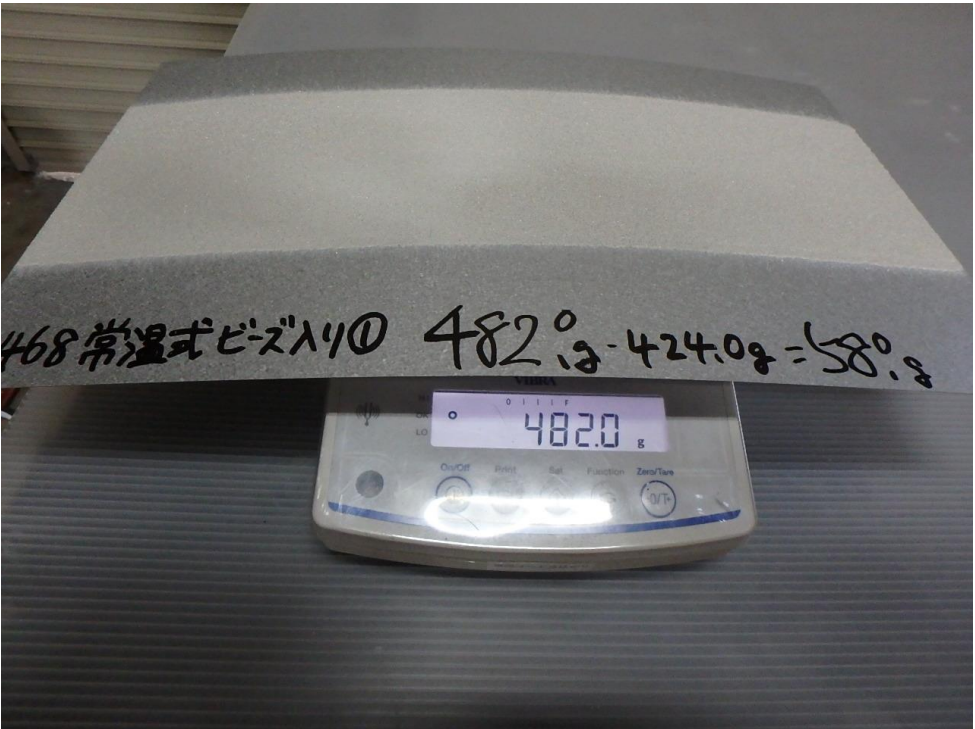

常 温 式
ビーズ入り
吐出後テスト板 計量状況
1枚目
総重量 482.0g
テスト板重量 424.0g
ペイント重量 58.0g
令和6年4月4日



常 温 式
ビーズ入り
吐出後テスト板 計量状況
立会人 工事課長 中城 勝
令和6年4月4日
